

Informe de Ejecución 2021 EDUSI Puertollano

1. Obligaciones de cumplimiento Regla N+3

El pasado mayo la U.G.EDUSI del Comité de Seguimiento del POPE, la **Dirección General de Fondos Europeos** informaba de la necesidad de disponer de previsiones de ejecución de las distintas Estrategias DUSI aprobadas, por lo que se solicitó a esta Unidad de Gestión la información relativa a la "**PREVISIONES EJECUCIÓN**" para estimar el cumplimiento de la regla N+3 para este año 2021.

REGLA N+3= 3.750.000,00 € (30%) a 31-12-2021

SENDA FINANCIERA PROPUESTA Unidad de Gestión EDUSI Puertollano (U.G.):

- 2020: 60.000 (2,4%)
- 2020: propuesta 705.277,00 (5,5%)
- 2021: 3.011.174,00 (24,08)

2. Ejecución EDUSI Puertollano 2023

El esfuerzo de ejecución del programa, a través de los diferentes contratos de las Unidades Ejecutoras de este Ayuntamiento (Concejales/as y Técnicos/as, como el visto buenos de Intervención, Tesorería y Contratación), a falta de siete meses para el periodo de evaluación previsto por la DGFE para el 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:

1. Presupuesto en ejecución por las Unidades Ejecutoras MAYO 2021:

2.558.509,7 € (-1.191.490,3 € A 31/12/21)

20,47 % de la EDUSI Puertollano 2023 (-9,53 N+3)

2. Presupuesto facturado MAYO 2021:

192.352,55 € (-3.565.988,45 €)

5,2% de la EDUSI Puertollano 2023 (-24,8 Regla N+3)

En las siguientes páginas se desglosan los totales por Objetivos y Operaciones.

UNA MANERA DE HACER EUROPA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20


Operaciones EDUSI 2021

- Tabla Resumen por Objetivos Temáticos.
- Contratos y estado.
- Desglose de operaciones por Línea de Actuación.

1. TABLA RESUMEN POR OBJETIVOS TEMÁTICOS

OBJETIVO TEMÁTICO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	DISPUESTO 2021	%	OBJETIVO 30% 31/12/21	RESPONSABLE
OT2	ACCESO Y USO A TIC	1.200.000,00	230.000,00	19,17 %	10,83 %	ÁREA INNOVACIÓN
OT4	BAJO NIVEL CARBONO	3.000.000,00	264.328,70	8,81 %	21,19 %	ÁREA URBANISMO
OT6	CONSERVAR MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO	3.000.000,00	450.180,00	15,01 %	14,99 %	ÁREA URBANISMO
OT9	INCLUSIÓN	4.800.000,00	1.290.481,00	26,89 %	3,11 %	ÁREA URBANISMO Y SERVICIOS SOCIALES
OT99	ASISTENCIA	500.000,00	323.520,00	64,70 %	-34,70 %	ALCALDÍA
TOTAL	EDUSI PUERTOLLANO 2023	12.500.000,00	2.558.509,70	20,47 %	9,53 %	

● DISPUESTO ● RESTO EDUSI

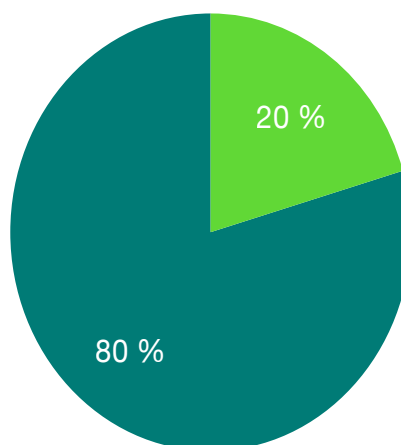

2. LISTADO TOTAL DE CONTRATOS PROGRAMADOS EDUSI

1. EQUIPAMIENTO CPD. 230.000,00 **EN CONTRATACIÓN**
 1. LA_01 196.000 (LOTE 1)
 2. LA_02 34.000 (LOTE 2)
2. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN. LA_01
3. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL. LA_01
4. IMPLANTACIÓN DE TARJETA. LA_01
5. REDACCIÓN PMUS - 40.498,70 € - **EN EJECUCIÓN**
6. ACCIONES DE MOVILIDAD DE DESARROLLO URBANO. PENDIENTE DE PLAN.
7. ACCIONES MOVILIDAD POLICIA LOCAL. PENDIENTE DE PLAN.
8. LOTE 1 Oficina de Proyectos. 26.620,00 (L_3) - **EN CONTRATACIÓN ***
9. AUDITORIA DE EDIFICOS MUNICIPALES - 75.000,00 **EN CONTRATACIÓN**
10. ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. PENDIENTE DE PLAN.
11. LOTE 2 Oficina de Proyectos. 93.170,00 € (L_4) **EN CONTRATACIÓN ***
12. OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO Y GRAN CAPITAN 1. PENDIENTE DE PLAN.
13. LUMINARIAS POZO NORTE.
14. LUMINARIAS EXTERIORES INSTALACIONES DEPORTIVAS.
15. LUMINARIAS CALLE ANCHA.
16. LOTE 3 PROYECTO DE OBRA. 29.040,00 **EN CONTRATACIÓN ***
17. RECONSTRUCCIÓN MUSEO MINERÍA - 380.000,00 € (L_6) **EN CONTRATACIÓN**
18. PUESTA EN VALOR MUSEOS - 20.000,00 € **URGENTE PRESUPUESTO 2020**
19. EJECUCIÓN CALLE ANCHA - 800.000,00 €
20. REMODELACIÓN PLAZA DIEGO DE ALMAGRO - 200.000,00
21. ORDENACIÓN DEL POZO NORTE
22. LOTE 4 OFICINA PROTECTOS - 70.180,00 € (LA_8) **EN CONTRATACIÓN ***
23. REMODELACIÓN ESPACIOS OCIO Y DEPORTE POZO NORTE.
24. REMODELACIÓN ESPACIO PÚBLICO ENTORNO TÚNEL
25. DINAMIZACIÓN SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA
26. REMODELACIÓN PLAN PARQUES
27. DINAMIZACIÓN SOCIAL MEDIO AMBIENTAL - 20.000,00 € (L_9) **EN CONTRATACIÓN**
28. LOTE 5 OFICINA PROYECTOS 85.910,00 € (LA_9) **EN CONTRATACIÓN ***
29. PLAN DE COMERCIO 100.000,00 € (LA_10) **EN CONTRATACIÓN**

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

- 30. PEATONALIZACIÓN CALLE SANTÍSIMO 96.450,53 (L_10) **EJECUTADA**
- 31. PEATONALIZACIÓN CALLE PUERTO 148.990,47 (L_10) **EN CONTRATACIÓN**
- 32. ACCIONES DE EJECUCIÓN PLAN COMERCIAL. PENDIENTE DE PLAN.
- 33. LOTE 6 OFICINA PROYECTOS 30.250 € (L_10) **EN CONTRATACIÓN ***
- 34. REHABILITACIÓN PLAZAS CURTIDORES (?C/CERVANTES).
- 35. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
- 36. LOTE 7 OFICINA PROYECTOS 33.880,00 € (LA_11) **EN CONTRATACIÓN ***
- 37. ASISTENCIA TÉCNICA. 173.520,00 € **EN EJECUCIÓN**
- 38. COMUNICACIÓN. 150.000,00 € **EN EJECUCIÓN**

* **Incluido lotes de la contratación de la OFICINA DE PROYECTOS POR UN TOTAL DE 369.050,00 correspondiente a varias líneas de ejecución:**

- 1. LOTE 1 Oficina de Proyectos. 26.620,00 €
- 2. LOTE 2 Oficina de Proyectos. 93.170,00 € (LA_3)
- 3. LOTE 3 Oficina de Proyectos. 29.040,00 (LA_4)
- 4. LOTE 4 Oficina de Proyectos - 70.180,00 (LA_5)
- 5. LOTE 5 OFICINA PROYECTOS 85.910,00 (LA_9)
- 6. LOTE 6 OFICINA PROYECTOS 30.250 € (LA_10)
- 7. LOTE 7 OFICINA PROYECTOS 33.880,00 € (LA_11)

3. DESGLOSE OPERACIONES POR LÍNEA DE ACTUACIÓN

OT2

MEJORA EL ACCESO Y USO DE LAS TIC

Presupuesto 1.200.000,00 €

Dispuesto 230.000,00 € 19,2 % de EDUSI

CONTRATOS OT2:

- 1. EQUIPAMIENTO CPD. 230.000,00 (EN CONTRATACIÓN)
 - 1. LA_01 196.000 (LOTE 1)
 - 2. LA_02 34.000 (LOTE 2)
- 2. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Redacción pliego.
- 3. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
- 4. IMPLANTACIÓN DE TARJETA.

UNA MANERA DE HACER EUROPA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

LA_1 TRANSFORMACIÓN DIGITAL 1.000.000,00 € / Total en ejecución: 196.000,00 €
19,6%

EN CONTRATACIÓN 196.000,00 € LOTE 1 CPD

Resto de Estrategia 804.000,00 €

- **2020-2021: 517.000,00 € SIN COMPROMISO 321.000,00 €**
 - EN CONTRATO 196.000,00 € (CONTRATO LOTE 1 PLIEGO CPD)
 - 69.000,00 € (CONTRATO 2 TRAMITACIÓN). **2020 (19.000,00 €) resto 50.000,00**
 - 45.000,00 € (CONTRATO 3 FORMACIÓN). **2020 (20.000,00 €) resto 25.000,00**
 - 207.000,00 € (CONTRATO 4 TARJETA CIUDADANA)
- **2022-2023: 483.000,00 €**

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: **39.000,00** en contratos de línea 1.
RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 75.000,00 en contratos de línea 1.

L2 PLATAFORMA CIUDADANA 200.000,00 € / Total dispuesto: 34.000,00 € 17 %

EN CONTRATACIÓN 34.000,00 € (Lote 2 CPD)

Resto de Estrategia 166.000,00 €

- **2020-2021: 144.000 € SIN COMPROMISO 110.000,00 €**
 - EN CONTRATO 34.000,00 € (CONTRATO LOTE 1 PLIEGO CPD)
 - 83.000,00 € (CONTRATO 2 PLATAFORMA). **2020 (8.000,00 €) resto 75.000,00**
 - 27.000,00 € (CONTRATO 3 PORTAL TRANSPARENCIA). **2020 (27.000,00 €)**
- **2022-2023: 56.000 €**

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: 35.000,00 en contratos de línea 2.
RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 75.000,00 en contratos de línea 2.

OT4

FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO

Presupuesto 3.000.000,00 €

DISPUESTO 264.328,7 - 8,81 % de EDUSI

CONTRATOS EDUSI OT4

1. REDACCIÓN PMUS - 40.498,70 €
2. ACCIONES DE MOVILIDAD DE DESARROLLO URBANO.
3. ACCIONES MOVILIDAD POLICIA LOCAL
4. Lote 1 Oficina de Proyectos. 26.620,00
5. AUDITORIA DE EDIFICOS MUNICIPALES - 75.000,00
6. ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
7. LOTE 2 PROYECTO DE OBRA. 93.170,00 €
8. OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA AYUNTAMIENTO Y GRAN CAPITAN 1
9. LUMINARIAS POZO NORTE
10. LUMINARIAS EXTERIORES INSTALACIONES DEPORTIVAS
11. LUMINARIAS CALLE ANCHA
12. LOTE 3 PROYECTO DE OBRA. 29.040,00

LA_3 FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 600.000,00 € / Total dispuesto: 67.118,70 € 11,2 %

EN EJECUCIÓN: 40.498,70 € REDACCIÓN PMUS.

EN CONTRATACIÓN: 26.620,00 € Lote1 Proyectos

Resto de Estrategia: 532.881,30 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 525.000,0 € SIN COMPROMISO 457.881,3 €**
 - EJECUTANDOSE 40.498,70 € (REDACCIÓN PMUS) PRESUPUESTO 75.000,00 €
2020 (34.501,30 €)
 - CONTRATACIÓN 26.620,00 € (LOTE 1 PROYECTOS).
 - 423.380,00 ACCIONES DE MOVILIDAD.
- **2022-2023: 75.000,00 €**

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: 34.501,00 en contratos de línea 3
RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 423.000,00 en contratos de línea 3.

LA_4 EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES 1.700.000,00 € / Total dispuesto: 168.170 € 7,3 %

EN CONTRATACIÓN: 75.000,00 € Auditoría (2020 60.000,00 € 15.000 fin)

EN CONTRATACIÓN: 93.170 € Lote2 Proyectos

Resto de Estrategia: 1.531.830,00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 610.000,00 € SIN COMPROMISO 500.000,00 €**
 - CONTRATACIÓN: 60.000 € INICIO AUDITORIA PRESUPUESTO 75.000,00 €
 - CONTRATACIÓN 50.000,00 € (LOTE 2 PROYECTOS).
 - 500.000,00 ACCIONES EFICIENCIA EDIFICIOS.
- **2022-2023: 1.090.000 €**
 - CONTRATACIÓN 15.000,00 € FINAL AUDITORIA.
 - CONTRATACIÓN 43.170,00 (LOTE 2 PROYECTOS)
 - 1.031.830,00 € ACCIONES EFICIENCIA EDIFICIOS.

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: posible baja de contrato de auditoria línea 4.
RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 500.000,00 en contratos de línea 4.

LA_5 MEJORA Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS 700.000,00 € / Total dispuesto: 29,040 € 4,1 %

EN CONTRATACIÓN: 29.040 € Lote 3 Proyectos

Resto de Estrategia: 670.960,00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 29.040,00 € SIN COMPROMISO 0**
 - CONTRATACIÓN: 29.040,00 € (LOTE 3 PROYECTOS).
- **2022-2023: 670.9960,00 €**

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: 0

UNA MANERA DE HACER EUROPA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

OT6

CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

3.000.000,00 € (DISPUUESTO 450.180,00 € 15%)

CONTRATOS:

1. RECONSTRUCCIÓN MUSEO MINERÍA - 380.000,00 € (L_6)
2. PUESTA EN VALOR MUSEOS
3. EJECUCIÓN CALLE ANCHA
4. REMODELACIÓN PLAZA DIEGO DE ALMAGRO
5. ORDENACIÓN DEL POZO NORTE
6. LOTE 4 OFICINA PROTECTOS - 70.180,00 € (LA_8)

LA_6 PUESTA EN VALOR RED DE MUSEOS 400.000,00 € / Total dispuesto: 380.000,00 € 95 %

EN CONTRATACIÓN: 380.000,00 € RECONSTRUCCIÓN MUSEO MINERÍA

Resto de Estrategia: 20.000,00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 340.000,0 € SIN COMPROMISO 0 €**
 - CONTRATACIÓN 320.000,00 € (CONTRATO RECONSTRUCCIÓN MUSEO).
 - 20.000,00 € PUESTA EN VALOR MUSEOS. (2020 - 20.000,00 €)
- **2022-2023: 60.000 € SIN COMPROMISO 0 €**
 - CONTRATACIÓN 60.000,00 € (CONTRATO RECONSTRUCCIÓN MUSEO).

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: **20.000,00** en contratos de linea 6

LA_7 ACCIONES INTEGRADAS EN MEJORA DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE EN EL BULEVAR URBANO DE LA CALLE ANCHA 800.000,00 € / Total dispuesto: 0 € 0%

800.000,00 € CALLE ANCHA

- **2020-2021: 0 €**
- **2022-2023: 800.000,00 €**

UNA MANERA DE HACER EUROPA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

LA_8 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE ZONAS VERDES ESPECIALMENTE DEGRADADAS (CAÑAMARES-LIBERTA) / 1.800.000,00 € Total dispuesto: 70.180,00 € 3,9 %

EN CONTRATACIÓN: 70.180,00 € LOTE 4 OFICINA PROYECTOS

Resto de Estrategia: 1.729.000,00 €

- **2020-2021: 760.000,00 € SIN COMPROMISO 719.820,00 €**
 - CONTRATACIÓN 40.180,00 € (LOTE 4 OFICINA PROYECTOS).
 - 200.000,00 € REMODELACIÓN PZ DIEGO DE ALMAGRO
 - 519.820 € ORDENACIÓN POZO NORTE
- **2022-2023: 1.040.000,00 € SIN COMPROMISO 1.010.000,00 €**
 - CONTRATACIÓN 30.000,00 € (LOTE 4 OFICINA PROYECTOS).
 - 1.010.000,00 € ORDENACIÓN POZO NORTE

OT9 PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZ
4.800.000,00 € (DISPUUESTO 1.290.481,00 € 26,89 %)

CONTRATOS:

1. REMODELACIÓN ESPACIOS OCIO Y DEPORTE POZO NORTE.
2. REMODELACIÓN ESPACIO PÚBLICO ENTORNO TÚNEL
3. DINAMIZACIÓN SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA
4. REMODELACIÓN PLAN PARQUES. LA RINCONA 775.000,00 € (LA_9)
5. DINAMIZACIÓN SOCIAL MEDIO AMBIENTAL - 20.000,00 € (LA_9)
6. LOTE 5 OFICINA PROYECTOS 85.910,00 € (LA_9)
7. PEATONALIZACIÓN CALLE SANTÍSIMO 96.450,53 (LA_10)
8. PEATONALIZACIÓN CALLE PUERTO 148.990,47 (LA_10)
9. PLAN DE COMERCIO 100.000,00 € (LA_10)
10. ACCIONES DE EJECUCIÓN PLAN COMERCIAL
11. LOTE 6 OFICINA PROYECTOS 30.250 € (LA_10)
12. REHABILITACIÓN PLAZAS CURTIDORES (?C/CERVANTES)
13. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
14. LOTE 7 OFICINA PROYECTOS 33.880,00 € (LA_11)

UNA MANERA DE HACER EUROPA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

LA_9 REVITALIZACIÓN INTEGRAL ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES, CULTURALES, OCIO SALUDABLE Y CONVIVENCIA EN CAÑAMARES, MERCEDES, CARMEN, FRATERNIDAD Y LIBERTAD
2.000.000,00 € / Total dispuesto: 880.910,00 € 44 %

EN CONTRATACIÓN: 20.000,00 € DINAMIZACIÓN SOCIO MEDIO AMBIENTAL.

EN CONTRATACIÓN: 85.910,00 € Lote 5 OFICINA PROYECTOS

EN PROYECTO: 775.000,00 € REMODELACIÓN RINCONA

Resto de Estrategia: 1.119.090,00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 860.000,00 € SIN COMPROMISO 100.000,00 €**
 - 100.000 DEPORTE POZO NORTE
 - CONTRATACIÓN: 20.000,00 € DINAMIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL
 - PROYECTO 680.000,00 € LA RINCONA
 - CONTRATACIÓN 60.000,00 € LOTE 5 OFICINA PROYECTOS
- **2022-2023: 1.140.000,00 € SIN COMPROMISO 1.119.090,00 €**
 - 300.000 DEPORTE POZO NORTE
 - 550.000,00 REMODELACIÓN EL CARMEN
 - 50.000,00 DINAMIZACIÓN SOCIAL
 - 119.090,00 € PROYECTO PLAN DE PARQUES
 - CONTRATACIÓN 95.000 € LA RINCONA.
 - CONTRATACIÓN 25.910,00 € LOTE 5 PROYECTOS

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: Todo ejecutado.

RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 100.000,00 en contratos de línea 9

LA_10 PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 1.700.000,00 € / Total dispuesto: 375.691,00 € 22,1%

EJECUCIÓN: 96.450,53 € SANTÍSIMO

EN CONTRATACIÓN.: 279.240,47 €

- **148.990,47 € PUERTO**
- **100.000,00 € PLAN COMERCIO**
- **30.250,00 € LOTE 6 OFICINA PROYECTOS**

Resto de Estrategia: 1.324.309,00 €

SENDA FINANCIERA:

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

- **2020-2021: 1.016.701,00 € SIN COMPROMISO 651.010,00 €**
 - EJECUCIÓN: 96.450,53 SANTÍSIMO
 - EN CONTRATACIÓN 148.990,47 PUERTO
 - EN CONTRATACIÓN 100.000 PLAN DE COMERCIO
 - CONTRATACIÓN 20.250,00 € LOTE 6 OFICINA PROYECTOS
 - 651.010.00 € ACCIONES COMERCIALES
- **2022-2023: 683.299.00 € SIN COMPROMISO 673.299 €**
 - 673.299,00 ACCIONES PLAN COMERCIO
 - CONTRATACIÓN 10.000,00 € LOTE 6 OFICINA PROYECTOS

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: Todo ejecutado.

RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 651.010,00 en contratos de línea 10

LA_11 ACCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 1.100.000,00 € / Total dispuesto: 33.880,00 € 3,1%

EN CONTRATACIÓN: 33.880,00 € LOTE 7 OFICINA PROYECTOS

Resto de Estrategia: 1.066.120,00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 20.000,00 € SIN COMPROMISO 0 €**
 - CONTRATACIÓN 20,000,00 € LOTE 7 OFICINA PROYECTOS
- **2022-2023: 1.080.000.00 € SIN COMPROMISO 1.066.120,00 €**
 - CONTRATACIÓN 13.880,00 € LOTE 7 OFICINA PROYECTOS
 - 666.120,00 PLAZA CURTIDORES Y CERVANTES
 - 400.000,00 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

EJECUCIÓN NECESARIA EN 2021: Todo ejecutado.

RESTO PODRÍA PASARSE A 2022: 651.010,00 en contratos de línea 10

OT99 ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNICACIÓN 500.000,00 € (DISPUERTO 323.520,00 € 64,7 %)

CONTRATOS:

1. ASISTENCIA TÉCNICA. 173.520,00 €

2. COMUNICACIÓN. 150.000,00 €

EN CONTRATACIÓN 323.520,00 €

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER 2014-20

Resto de Estrategia: 176.480, 00 €

SENDA FINANCIERA:

- **2020-2021: 176.760 € SIN COMPROMISO 0 €**
 - EJECUCIÓN COMUNICACIÓN 90.000,00 €
 - EJECUCIÓN ASISTENCIA 86.760 € (EJECUTADO)
- **2022-2023: 146.760 € SIN COMPROMISO 176.480,00 €**
 - EJECUCIÓN COMUNICACIÓN 60.000,00 €
 - EJECUCIÓN ASISTENCIA 86.760 €

- 176.480 € ASITENCIA SIN COMPROMETER

El contrato de Asistencia técnica tuvo un presupuesto de 350.000,00 €, la baja de la empresa adjudicataria deja sin ejecutar **176.480,00 €** en asistencia técnica.

Se adjunta tabla de Estado y Senda Financiera hasta final de Estrategia a 1 de junio.

Esta información la realiza el Técnico de la U.G EDUSI, y ha sido validada el 1.06.2021 por la Asistencia Técnica, y se trasladará, con el VºBº de la Alcaldesa como responsable de la Unidad de Gestión, a la Coordinación de la Estrategia Edusi, a la Intervención y a todos las Unidades Ejecutoras responsables de las operaciones.

José Sánchez Vigara
Técnico Unidad de Gestión EDUSI
Firma Digital

VºBº
Isabel Rodríguez García
Alcaldesa-Presidenta y responsable U.G.EDUSI
Firma Digital
